TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Ks	Šachtový kónus zákrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
2	Š2	236.27	vozovka h = 0.0 m	236.27	232.99	232.99	3.28	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/1133 KOM tl.25cm	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
3	Š3	236.22	vozovka h = 0.0 m	236.22	233.04	233.04	3.18	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/943 KOM tl.25cm	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	2	TBS-Q.1 100/25	1		TBZ-Q.1 100/1133 KOM tl.25cm	1
								TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/50	1		TBZ-Q.1 100/943 KOM tl.25cm	1
												TBS-Q.1 100/100	2		těsnění pro DN 1000	6

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2017	Název stavby-objektu UNIČOV - OBNOVA KANALIZACE ULICE HRUBÉHO A DUKELSK Projektant AQOL s.r.o. Jméno dat SACHTY_KANALIZACE	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
2	Š2		TBZ-Q.1 100/1133 KOM tl.25cm	DN (mm)	687/597 C tř.95	DN (mm)	687/597 C tř.95	DN (mm)	355/300 C tř.160	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	Keramo-Steinzug	Úhel ß	180	Úhel ß	272	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	260	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	3.3	Materiál	Keramo-Steinzug	Materiál	Keramo-Steinzug	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton			sklon [‰]	3.3	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
3	Š3		TBZ-Q.1 100/943 KOM tl.25cm	DN (mm)	687/597 C tř.95	DN (mm)	687/597 C tř.95	DN (mm)	355/300 C tř.160	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	Keramo-Steinzug	Úhel ß	185	Úhel ß	92	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	70	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	3.3	Materiál	Keramo-Steinzug	Materiál	Keramo-Steinzug	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton			sklon [‰]	1.7	sklon [‰]	6.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	


PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2017	Název stavby-objektu UNIČOV - OBNOVA KANALIZACE ULICE HRUBÉHO A DUKELSK Projektant AQOL s.r.o. Jméno dat SACHTY_KANALIZACE	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


Prefa Brno a. s.

Šachta č.2 Š2

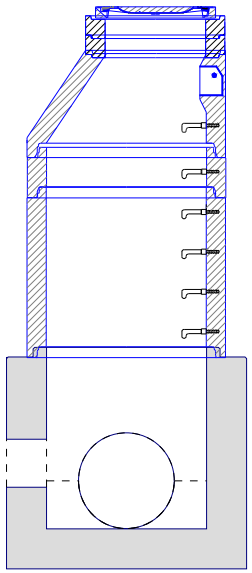

dno TBZ-Q.1 100/1133 KOM tl.25	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop B125 KBP11	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	232.99 m
kóta terénu	236.27 m
rozdíl kót	3.28 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.28 m
stavební výška	3.53 m

Šachta č.3 Š3

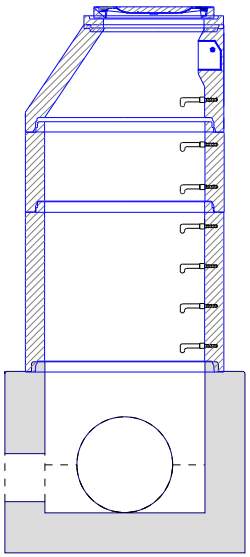

dno TBZ-Q.1 100/943 KOM tl.25c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop B125 KBP11	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	233.04 m
kóta terénu	236.22 m
rozdíl kót	3.18 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.18 m
stavební výška	3.43 m

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2017	Název stavby-objektu UNIČOV - OBNOVA KANALIZACE ULICE HRUBÉHO A DUKELSK Projektant AQOL s.r.o. Jméno dat SACHTY_KANALIZACE	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
2	Š2	B	Poklop B125 KBP11	víko GU B125 bez odvětrání, rám litinový 70mm s pantem	skladba komunikace	70	1
3	Š3	B	Poklop B125 KBP11	víko GU B125 bez odvětrání, rám litinový 70mm s pantem	skladba komunikace	70	1
	Celkem	B	Poklop B125 KBP11	víko GU B125 bez odvětrání, rám litinový 70mm s pantem		70	2

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
SWECO Sustainable engineering and design	UNIČOV - OBNOVA KANALIZACE ULICE HRUBÉHO A DUKELSK	
	Projektant AQOL s.r.o.	
(C) 1996-2017	Jméno dat SACHTY_KANALIZACE	
